

Id	Nombre de tarea	% completado	Comienz
1	Plan Operativo Anual- Gerencia Servicios Generales Anual 2013	6%	Jun 11,
2	Implementación de Medidas de Seguridad de las Instalaciones Físicas y de las Personas de la Institución	6%	Jun 11,
3	Instalación de Escalera de Emergencia	11%	Jun 11,
4	Elaborar requerimiento contratación a firma consultora	100%	Jun 11,
5	Aprobación requerimiento	100%	vie 15,
6	Solicitud aprobación al DAF	100%	vie 15,
7	Solicitud aprobación por DAF al DG	100%	Jun 18,
8	Aprobación por DG	100%	Jun 18,
9	Elaboración de diseño arquitectónico, cálculo Estructural y presupuesto base	14%	mié 27/
10	Solicitud elaboración a firma consultora	100%	mié 27/
11	Recepción de propuesta	0%	vie 12/
12	Evaluación de Propuesta	0%	Jun 15/
13	Someter Propuesta a la aprobación del COE	0%	Jun 18/
14	Recepción Propuesta aprobada por el COE	0%	mié 07/
15	Concurso por Comparación de Precios	0%	jue 08/
16	Elaboración del Pliego de Condiciones	0%	jue 08/
17	Llamado a Concurso	0%	Jun 12/
18	Ejecución de Concurso	0%	mié 14/
19	Firma de Contrato	0%	jue 08/
20	Ejecución de obra	0%	jue 15/
21	Recepción de obra	0%	Jun 30/
22	Implementación Medidas de contingencia ante posibles desastres	0%	Jun 07/




Project: Plantilla Project con Dias Feri Task Split

Date: mar 02/07/13 Progress Milestone

Summary Project Summary External Tasks External Milestone

2012				2013				2014				2015				2016			
T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	

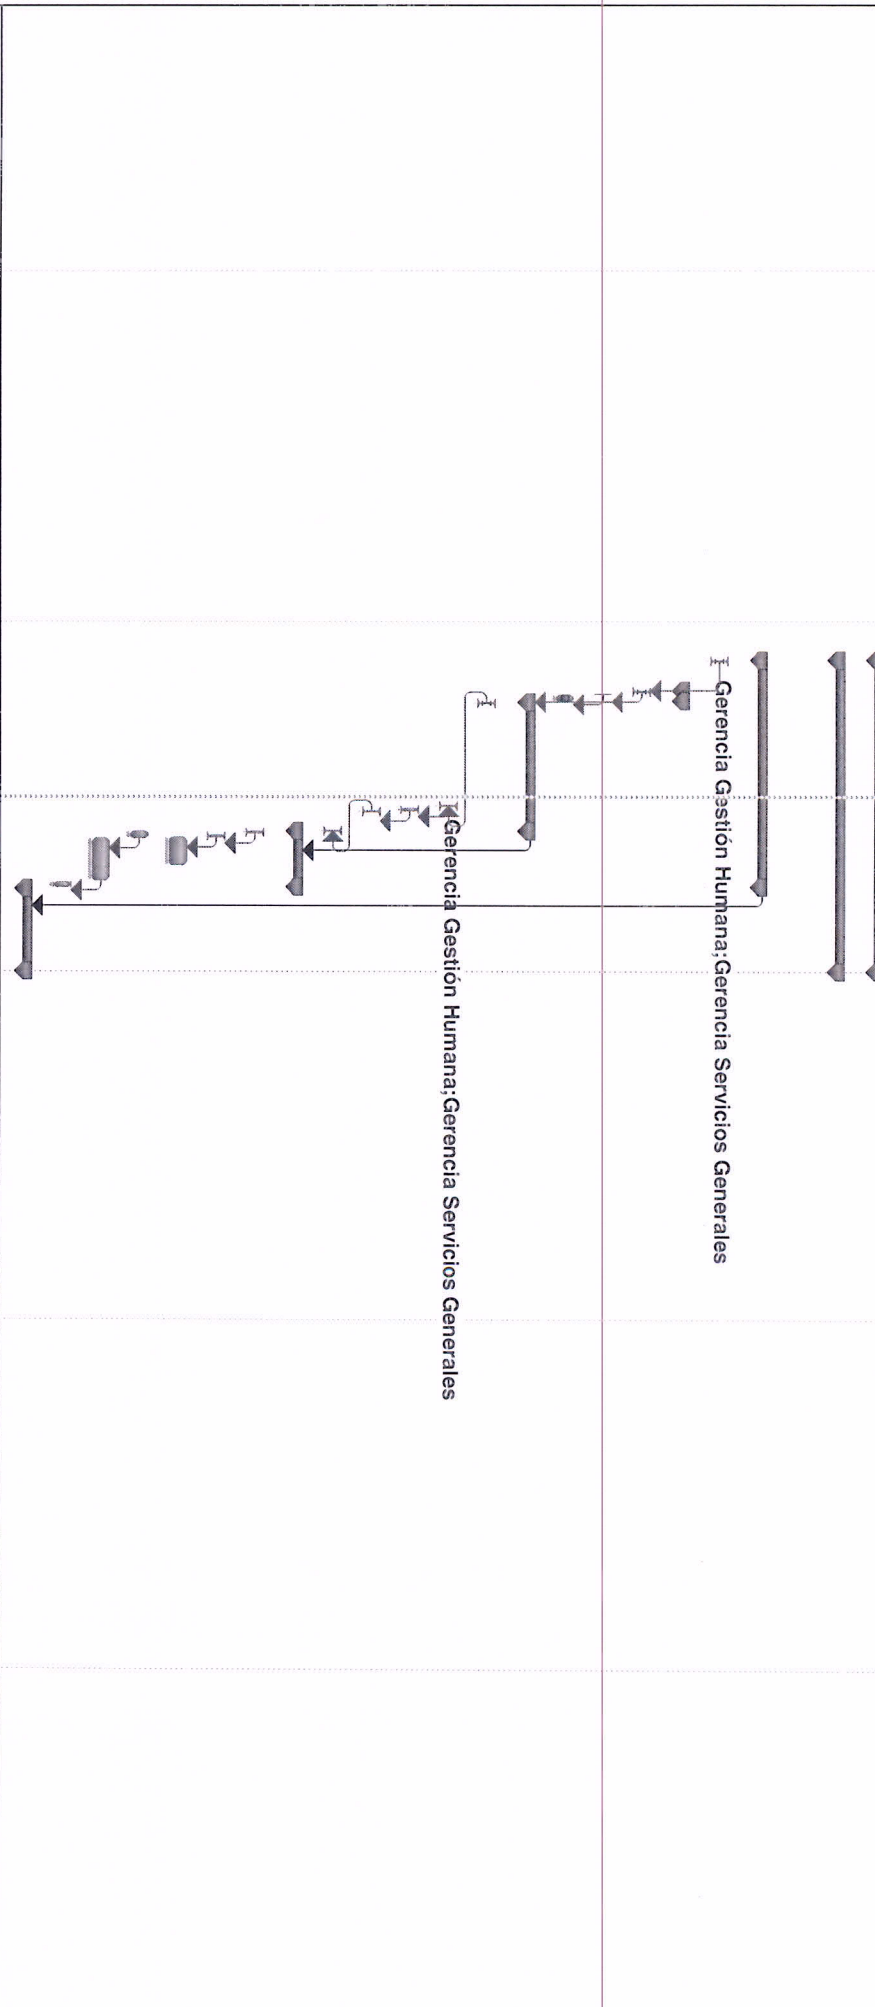

[Handwritten signature]

Project: Plantilla Project con Dias Feri
 Date: mar 02/07/13

- Task
- Split
- Progress
- Milestone
- Summary
- Project Summary
- External Tasks
- External Milestone
