Id	Task Name	% Completado	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**Plan Operativo Anual 2013-Gerencia Subsidios**	**6%**	**353 días**	**mar 14/05/13**	**jue 25/09/14**	
2	**Proyecto Transparencia- Histórico de Transacciones**	**6%**	**353 días**	**mar 14/05/13**	**jue 25/09/14**	
3	**Modificación de la aplicación para la carga de archivos grandes.**	**0%**	**23 días**	**lun 15/07/13**	**mié 14/08/13**	
4	Realizar cambios a la Aplicación.	0%	10 días	lun 15/07/13	vie 26/07/13	
5	Realizar pruebas con los cambios aplicados.	0%	3 días	lun 29/07/13	mié 31/07/13	4
6	Reportar errores	0%	1 día	jue 01/08/13	jue 01/08/13	5
7	Recibir corrección de errores	0%	5 días	vie 02/08/13	jue 08/08/13	6
8	Realizar pruebas después de las correcciones	0%	3 días	vie 09/08/13	mar 13/08/13	7
9	Aceptación de cambios aplicados	0%	1 día	mié 14/08/13	mié 14/08/13	8
10	**Validacion Archivo Historico de las EF's**	**12%**	**145 días**	**mar 14/05/13**	**vie 06/12/13**	
11	**Validacion Archivo Histórico APAP**	**16%**	**83 días**	**mar 14/05/13**	**lun 09/09/13**	
12	Carga de los 12 Archivos Históricos a la Herramienta	91%	45 días	mar 14/05/13	jue 22/08/13	9
13	Identificar diferencias	9%	75 días	mié 15/05/13	jue 29/08/13	12CC+1 día
14	Reportar Diferencias Encontradas al area correspondiente	7%	75 días	jue 16/05/13	vie 30/08/13	13CC+1 día
15	Recibir Correcciones de Diferencias Detectada	3%	75 días	mar 21/05/13	mié 04/09/13	14CC+3 día
16	Recargar Información Corregida	2%	75 días	mié 22/05/13	jue 05/09/13	15CC+1 día
17	Elaboracion Informe de Resultado APAP	0%	2 días	vie 06/09/13	lun 09/09/13	16
18	**Validacion Archivo Historico BRRD**	**5%**	**104 días**	**mar 18/06/13**	**mié 13/11/13**	
19	Carga de los 7 Archivos Históricos a la Herramienta	14%	71 días	mar 18/06/13	jue 26/09/13	
20	Identificar diferencias	0%	28 días	vie 27/09/13	mié 06/11/13	19
21	Reportar Diferencias Encontradas al area correspondiente	0%	28 días	lun 30/09/13	jue 07/11/13	20CC+1 día
22	Recibir Correcciones de Diferencias Detectada	0%	28 días	mar 01/10/13	vie 08/11/13	21CC+1 día
23	Recargar Información Corregida	0%	28 días	mié 02/10/13	lun 11/11/13	22CC+1 día
24	Elaboracion Informe de Resultado BRRD	0%	2 días	mar 12/11/13	mié 13/11/13	23
25	**Validacion Archivo Historico ACAP**	**21%**	**126 días**	**mar 14/05/13**	**lun 11/11/13**	
26	Carga de los 3 Archivos Históricos a la Herramienta	33%	105 días	mar 14/05/13	jue 10/10/13	
27	Identificar diferencias	0%	15 días	vie 11/10/13	jue 31/10/13	26
28	Reportar Diferencias Encontradas al area correspondiente	0%	15 días	lun 14/10/13	vie 01/11/13	27CC+1 día
29	Recibir Correcciones de Diferencias Detectada	0%	15 días	jue 17/10/13	jue 07/11/13	28CC+3 día
30	Recargar Información Corregida	0%	15 días	vie 18/10/13	vie 08/11/13	29CC+1 día
31	Elaboracion Informe de Resultado ACAP	0%	1 día	lun 11/11/13	lun 11/11/13	30
32	**Validacion Archivo Histórico ALNAP**	**0%**	**40 días**	**vie 11/10/13**	**vie 06/12/13**	
33	Carga de los 8 Archivos Históricos a la Herramienta	0%	32 días	vie 11/10/13	mar 26/11/13	26
34	Identificar diferencias	0%	32 días	lun 14/10/13	mié 27/11/13	33CC+1 día
35	Reportar Diferencias Encontradas al area correspondiente	0%	32 días	mar 15/10/13	jue 28/11/13	34CC+1 día
36	Recibir Correcciones de Diferencias Detectada	0%	32 días	vie 18/10/13	mar 03/12/13	35CC+3 día
37	Recargar Información Corregida	0%	32 días	lun 21/10/13	mié 04/12/13	36CC+1 día
38	Elaboracion Informe de Resultado ALNAP	0%	2 días	jue 05/12/13	vie 06/12/13	37
39	**Comprobar La Coincidencia de Los Montos Totales en Archivo Historico por EF**	**0%**	**114 días**	**vie 06/09/13**	**lun 17/02/14**	
40	**Comprobar La Coincidencia de Los Montos Totales en Archivo Historico APAP**	**0%**	**52 días**	**vie 06/09/13**	**mié 20/11/13**	
41	Ejecutar opcion para comprobar que la sumatoria de todos los Creditos Aplicado	0%	5 días	vie 06/09/13	jue 12/09/13	16
42	Reportar Diferencias Encontradas a la Entidad Financiera	0%	10 días	vie 13/09/13	vie 27/09/13	41
43	Recibir Correcciones de Diferencias Detectada	0%	20 días	lun 30/09/13	vie 25/10/13	42
44	Revalidar y Cargar Información Corregida	0%	15 días	lun 28/10/13	lun 18/11/13	43
45	Elaboracion Informe de Resultado APAP	0%	2 días	mar 19/11/13	mié 20/11/13	44
46	**Comprobar La Coincidencia de Los Montos Totales en Archivo Historico BRRD**	**0%**	**52 días**	**mar 12/11/13**	**jue 23/01/14**	
47	Ejecutar opcion para comprobar que la sumatoria de todos los Creditos Aplicado	0%	5 días	mar 12/11/13	lun 18/11/13	23
48	Reportar Diferencias Encontradas a la Entidad Financiera	0%	10 días	mar 19/11/13	lun 02/12/13	47

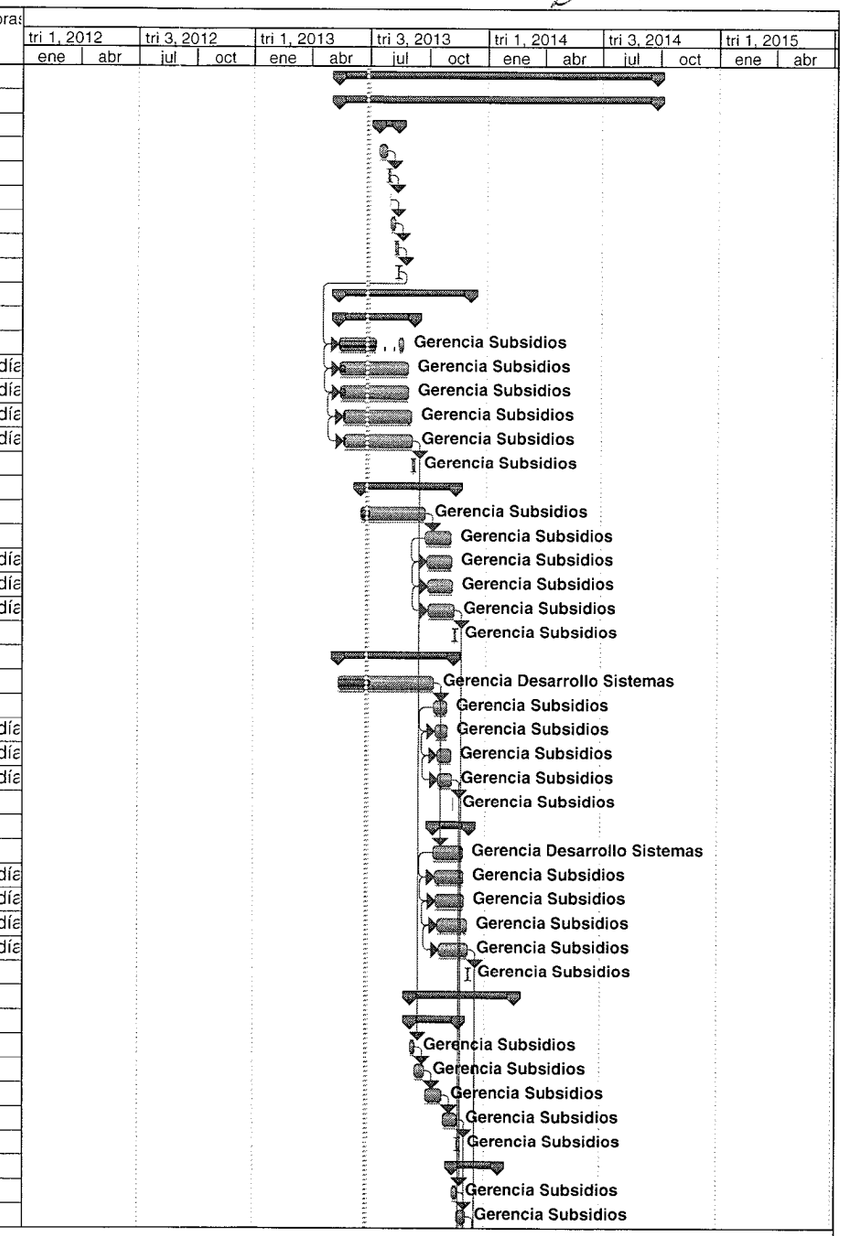

Project: Plantilla Project con Dias Feri
Date: mié 26/06/13

Task | Progress | Summary | External Tasks | Deadline
Split | Milestone | Project Summary | External Milestone

Id	Task Name	% Completado	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
49	Recibir Correcciones de Diferencias Detectada	0%	20 días	mar 03/12/13	mar 31/12/13	48
50	Revalidar y Cargar Información Corregida	0%	15 días	mié 01/01/14	mar 21/01/14	49
51	Elaboracion Informe de Resultado BRRD	0%	2 días	mié 22/01/14	jue 23/01/14	50
52	**Comprobar La Coincidencia de Los Montos Totales en Archivo Historico ACAP**	**0%**	**52 días**	**lun 11/11/13**	**mié 22/01/14**	
53	Ejecutar opcion para comprobar que la sumatoria de todos los Creditos Aplicado	0%	5 días	lun 11/11/13	vie 15/11/13	30
54	Reportar Diferencias Encontradas a la Entidad Financiera	0%	10 días	lun 18/11/13	vie 29/11/13	53
55	Recibir Correcciones de Diferencias Detectada	0%	20 días	lun 02/12/13	lun 30/12/13	54
56	Revalidar y Cargar Información Corregida	0%	15 días	mar 31/12/13	lun 20/01/14	55
57	Elaboracion Informe de Resultado ACAP	0%	2 días	mar 21/01/14	mié 22/01/14	56
58	**Comprobar La Coincidencia de Los Montos Totales en Archivo Historico ALNAI**	**0%**	**52 días**	**jue 05/12/13**	**lun 17/02/14**	
59	Ejecutar opcion para comprobar que la sumatoria de todos los Creditos Aplicado	0%	5 días	jue 05/12/13	mié 11/12/13	37
60	Reportar Diferencias Encontradas a la Entidad Financiera	0%	10 días	jue 12/12/13	jue 26/12/13	59
61	Recibir Correcciones de Diferencias Detectada	0%	20 días	vie 27/12/13	jue 23/01/14	60
62	Revalidar y Cargar Información Corregida	0%	15 días	vie 24/01/14	jue 13/02/14	61
63	Elaboracion Informe de Resultado ALNAP	0%	2 días	vie 14/02/14	lun 17/02/14	62
64	**Conciliar Individual Por Cuenta Archivo Historico por EF**	**0%**	**219 días**	**mar 19/11/13**	**lun 22/09/14**	
65	**Conciliar Individual Por Cuenta Archivo Historico APAP**	**0%**	**157 días**	**mar 19/11/13**	**jue 26/06/14**	
66	Ejecutar cuadre individual por cuenta	0%	10 días	mar 19/11/13	lun 02/12/13	44
67	Enviar Archivos con Errores de Transacciones Históricas a la Entidad Financier	0%	45 días	mar 03/12/13	mar 04/02/14	66
68	Recepción de Archivos de Transacciones Corregidos de la Entidad Financier	0%	60 días	mié 05/02/14	mar 29/04/14	67
69	Revalidar Archivos de las Transacciones Corregidos	0%	20 días	mié 30/04/14	mar 27/05/14	68
70	Cargar en la Base de Datos el Archivo Historico de Transacciones	0%	20 días	mié 28/05/14	mar 24/06/14	69
71	Elaboracion Informe de Resultado APAP	0%	2 días	mié 25/06/14	jue 26/06/14	70
72	**Conciliar Individual Por Cuenta Archivo Historico BRRD**	**0%**	**157 días**	**mié 22/01/14**	**jue 28/08/14**	
73	Ejecutar cuadre individual por cuenta	0%	10 días	mié 22/01/14	mar 04/02/14	50
74	Enviar Archivos con Errores de Transacciones Históricas a la Entidad Financier	0%	45 días	mié 05/02/14	mar 08/04/14	73
75	Recepción de Archivos de Transacciones Corregidos de la Entidad Financier	0%	60 días	mié 09/04/14	mar 01/07/14	74
76	Revalidar Archivos de las Transacciones Corregidos	0%	20 días	mié 02/07/14	mar 29/07/14	75
77	Cargar en la Base de Datos el Archivo Historico de Transacciones	0%	20 días	mié 30/07/14	mar 26/08/14	76
78	Elaboracion Informe de Resultado BRRD	0%	2 días	mié 27/08/14	jue 28/08/14	77
79	**Conciliar Individual Por Cuenta Archivo Historico ACAP**	**0%**	**157 días**	**mar 21/01/14**	**mié 27/08/14**	
80	Ejecutar cuadre individual por cuenta	0%	10 días	mar 21/01/14	lun 03/02/14	56
81	Enviar Archivos con Errores de Transacciones Históricas a la Entidad Financier	0%	45 días	mar 04/02/14	lun 07/04/14	80
82	Recepción de Archivos de Transacciones Corregidos de la Entidad Financier	0%	60 días	mar 08/04/14	lun 30/06/14	81
83	Revalidar Archivos de las Transacciones Corregidos	0%	20 días	mar 01/07/14	lun 28/07/14	82
84	Cargar en la Base de Datos el Archivo Historico de Transacciones	0%	20 días	mar 29/07/14	lun 25/08/14	83
85	Elaboracion Informe de Resultado ACAP	0%	2 días	mar 26/08/14	mié 27/08/14	84
86	**Conciliar Individual Por Cuenta Archivo Historico ALNAP**	**0%**	**157 días**	**vie 14/02/14**	**lun 22/09/14**	
87	Ejecutar cuadre individual por cuenta	0%	10 días	vie 14/02/14	jue 27/02/14	62
88	Enviar Archivos con Errores de Transacciones Históricas a la Entidad Financier	0%	45 días	vie 28/02/14	jue 01/05/14	87
89	Recepción de Archivos de Transacciones Corregidos de la Entidad Financier	0%	60 días	vie 02/05/14	jue 24/07/14	88
90	Revalidar Archivos de las Transacciones Corregidos	0%	20 días	vie 25/07/14	jue 21/08/14	89
91	Cargar en la Base de Datos el Archivo Historico de Transacciones	0%	20 días	vie 22/08/14	jue 18/09/14	90
92	Elaboracion Informe de Resultado ALNAP	0%	2 días	vie 19/09/14	lun 22/09/14	91
93	**Informe Final Proyecto Historico de Transacciones**	**0%**	**3 días**	**mar 23/09/14**	**jue 25/09/14**	
94	Elaboracion Informe Final Proyecto Historico de Transacciones	0%	2 días	mar 23/09/14	mié 24/09/14	92
95	Remision al DFA	0%	1 día	jue 25/09/14	jue 25/09/14	94

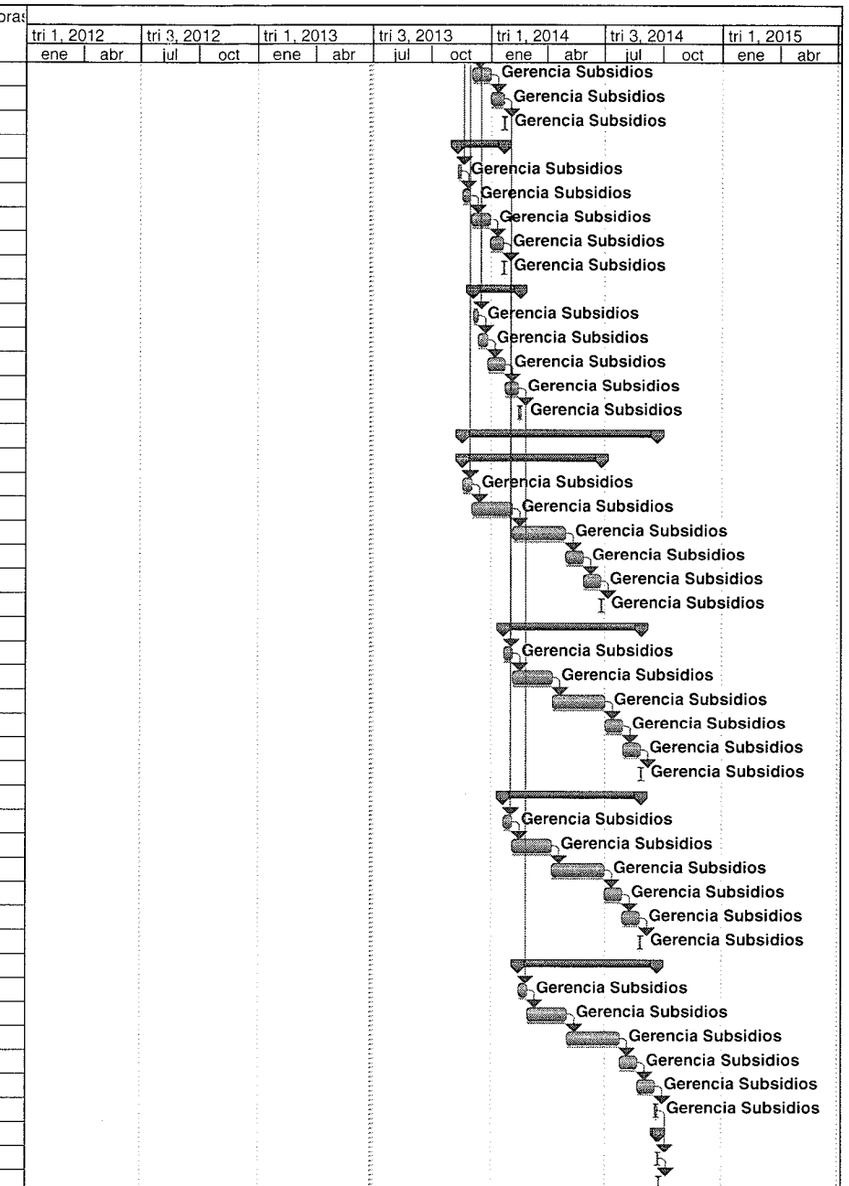

Project: Plantilla Project con Dias Feri
Date: mié 26/06/13

Task | Progress | Summary | External Tasks | Deadline
Split | Milestone | Project Summary | External Milestone
